FASE LAVORATIVA		SOTTOFASE LAVORATIVA	
		Pisa, Via Alessandro da Morrona	
A	Allestimento cantiere	1	Allestimento cantiere
		2	Opere provvisionali
B	Scavi e fondazioni	3	Realizzazione di scavi
		4	Realizzazione di fondazioni
C+ C1	Opere in c.a. e murature portanti	5	Armatura e getto del solaio piano interrato
		6	Opere provvisionali
		7	Opere in elevazione piano interrato
		8	Armatura e getto del solaio piano terra
		9	Opere provvisionali
		10	Opere in elevazione piano terra
		11	Realizzazione travi e solaio piano primo
		12	Ponteggi e opere provvisionali
		13	Opere in elevazione piano primo
		14	Realizzazione travi e solaio piano sec.
		15	Ponteggi e opere provvisionali
		16	Opere in elevazione piano secondo
		17	Realizzazione travi e solaio piano terzo
		18	Ponteggi e opere provvisionali
		19	Opere in elevazione piano terzo
		20	Realizzazione travi e solaio copertura
D1	Copertura	21	Coibentazione e impermeabilizzazione
		22	Lattonerie e fotovoltaici
E1	Murature esterne e pareti divisorie	23	Murature esterne e pareti divisorie interne
		24	Posa in opera di soglie e davanzali
F1	Impianti e massetti	25	Impianto elettrico, telefonico e TV
		26	Impianto acqua, gas, sanitario
		27	Impianto riscaldamento
		28	Realizzazione massetti impianti
		29	Posa in opera materiale fonoassorbente
		30	Realizzazione massetto pavimenti
G1	Finiture	31	Intonaci esterni
		32	Intonaci interni
		33	Pavimenti e rivestimenti
		34	Tinteggiatura esterna
		35	Tinteggiatura interna
		36	Rivestimenti esterni
		37	Posa in opera di infissi e sanitari
C2	Opere in c.a. e murature portanti	38	Opere provvisionali
		39	Opere in elevazione piano terra
		40	Realizzazione travi e solaio piano primo
		41	Ponteggi e opere provvisionali
		42	Opere in elevazione piano primo
		43	Realizzazione travi e solaio piano sec.
		44	Ponteggi e opere provvisionali
		45	Opere in elevazione piano secondo
		46	Realizzazione travi e solaio piano terzo
		47	Ponteggi e opere provvisionali
		48	Opere in elevazione piano terzo
		49	Realizzazione travi e solaio copertura
D2	Copertura	50	Coibentazione e impermeabilizzazione
		51	Lattonerie e fotovoltaici
E2	Murature esterne e pareti divisorie	52	Murature esterne e pareti divisorie interne
		53	Posa in opera di soglie e davanzali
F2	Impianti e massetti	54	Impianto elettrico, telefonico e TV
		55	Impianto acqua, gas, sanitario
		56	Impianto riscaldamento
		57	Realizzazione massetti impianti
		58	Posa in opera materiale fonoassorbente
		59	Realizzazione massetto pavimenti
G2	Finiture	60	Intonaci esterni
		61	Intonaci interni
		62	Pavimenti e rivestimenti
		63	Tinteggiatura esterna
		64	Tinteggiatura interna
		65	Rivestimenti esterni
		66	Posa in opera di infissi e sanitari
H	Opere esterne	67	Fognatura esterna
		68	Smobilizzo cantiere
		69	Pavim. esterna e sistemazione verde

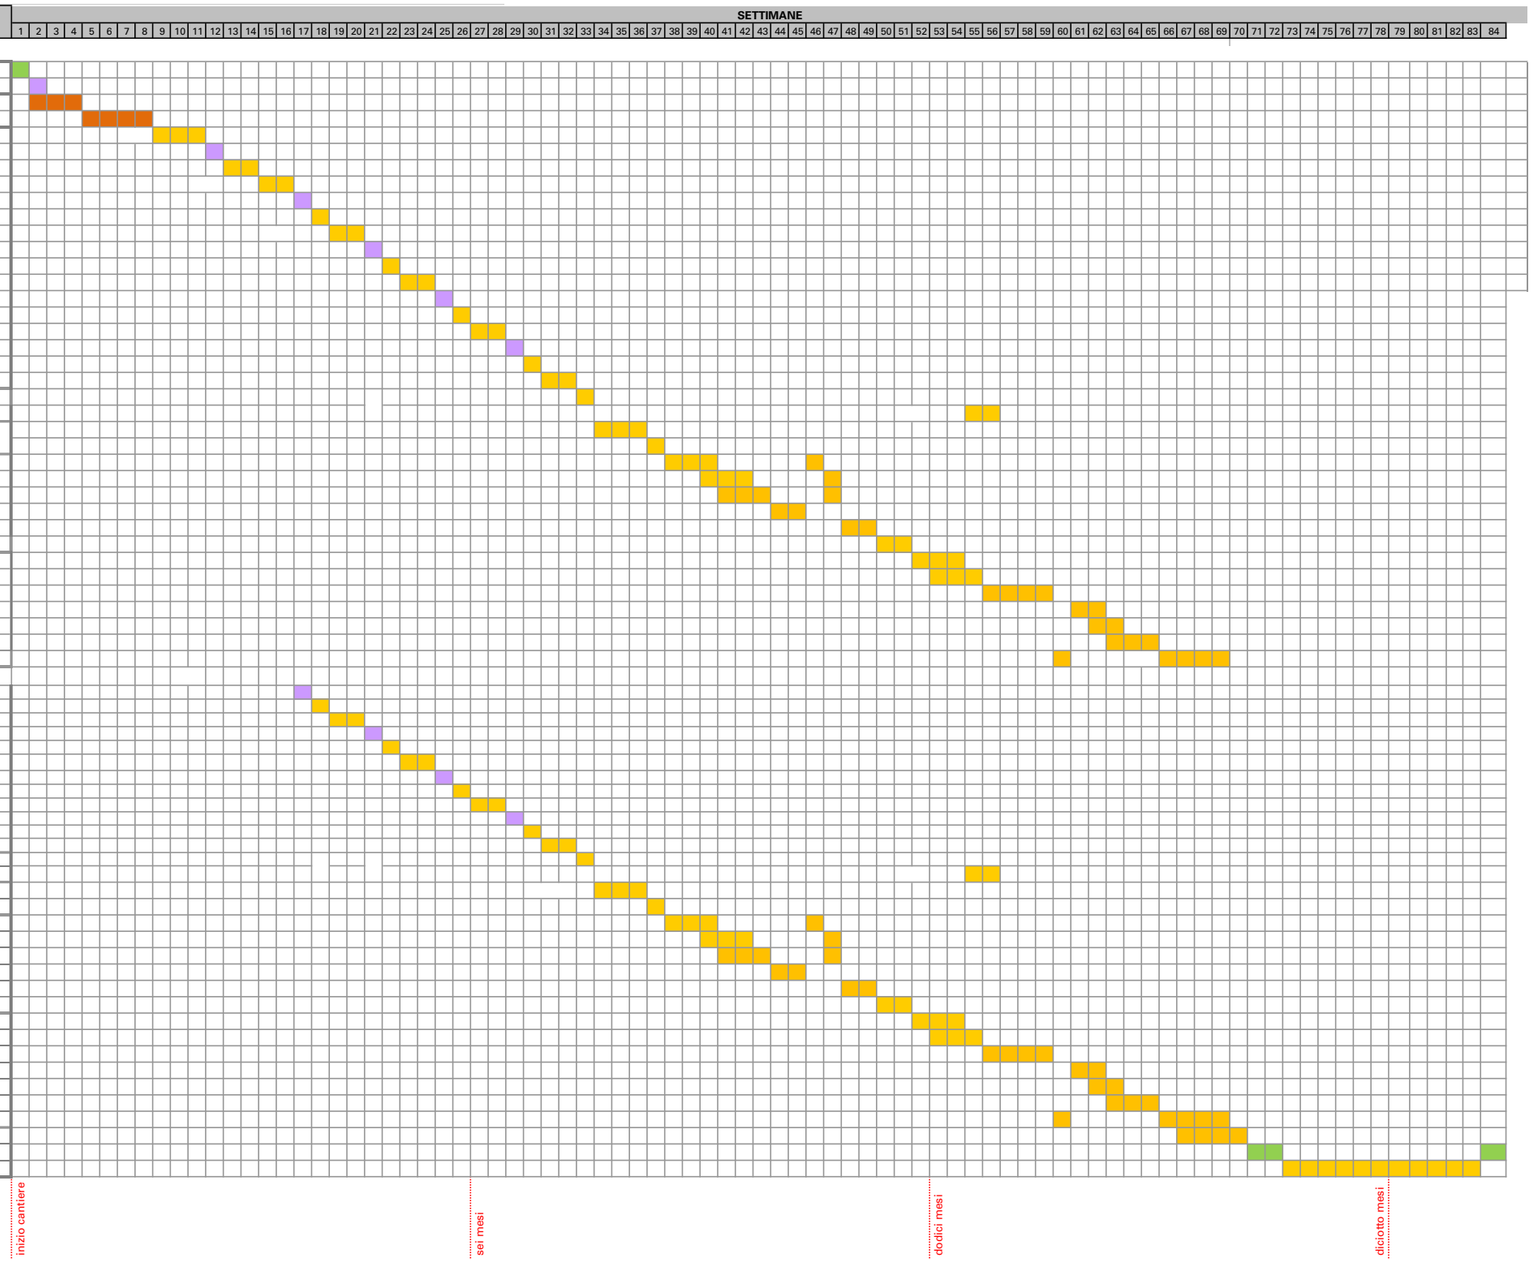

LEGENDA

- allestimento e smantellamento cantiere
- ponteggi e opere provvisionali
- Scavi e fondazioni
- opere edili
