GANTT

6 - CHIANNI_VIA DELLA RIMEMBRANZA 12
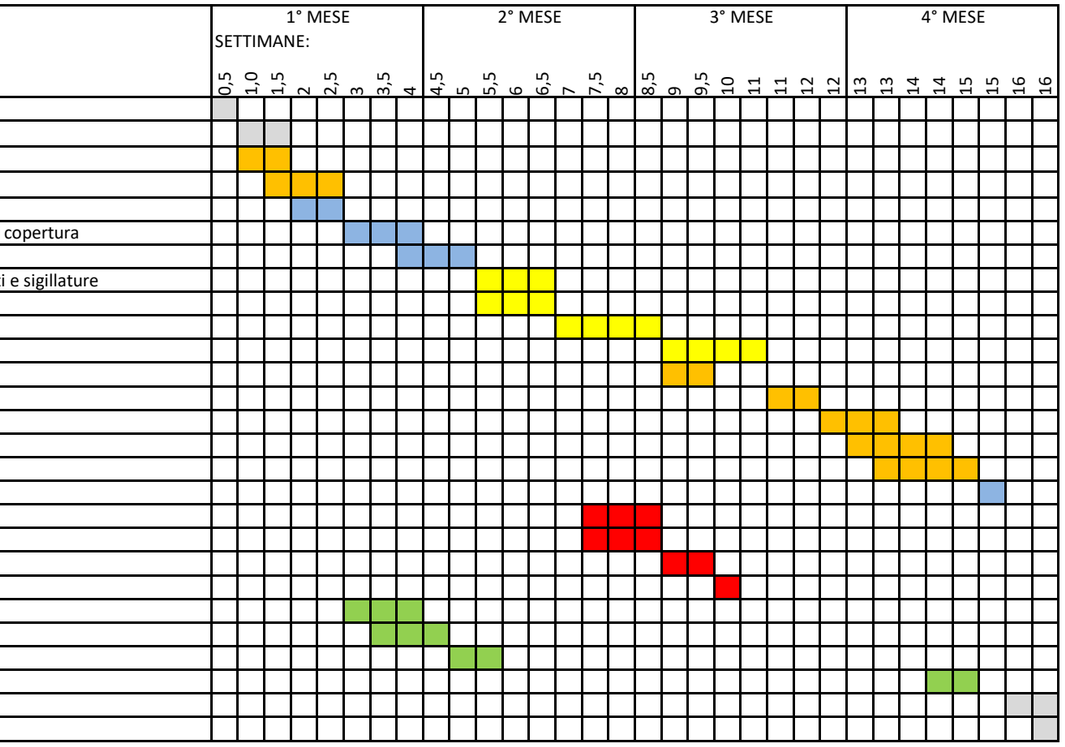
	FASE LAVORATIVA		SOTTOFASE LAVORATIVA
A	Opere provvisionali	A1	Allestimento cantiere
		A2	Opere provvisionali: montaggio del ponteggio
D	Coibentazione piani nonriscaldati	D6	Fissaggio dei pannelli di polistirene espanso
		D7	Posa del rasante-rete-rasante con lisciatura
B	Coibentazione tetto	B9	Rimozione manto di copertura
		B4	Posa del pachetto quale barriere, isolamento, guaina e manto di copertura
		B10	Posa di lattonerie, ripristino di gronde
C	Sostituzione infissi e sistemi oscuranti	C1	Rimozione vecchi infissi e installazione dei nuovi telai, isolamenti e sigillature
		C2	Rimozione sistema oscurante
		C3	Installazione del sistema di fissaggio e degli oscuranti
		C4	Realizzazione del raccordo per il cappotto
D	Posa di cappotto termico	D1	Ripristino di porzioni intonaco deteriorato
		D2	Fissaggio dei profili di partenza
		D3	Fissaggio delle lastre con la malta e tassellatura
		D4	Posa del rasante-rete-rasante con lisciatura
		D5	Applicazione primer e rivestimento colorato
F	Ulteriori interventi necessari	F1	Sostituzione lattoneria
E	Revisione impianto climatizzazione	E1	Sostituzione generatori di calore, cronotermostato e accessori
		E2	Sostituzione di radiatori
		E3	Realizzazione di eventuali sistemi scarico singolo o collettivo
		E4	Lavaggio e verifiche tenuta impianto termico
F	Ulteriori interventi necessari	F10	Impermeabilizzazione di logge
		F3	Rifacimento pacchetto terrazzo
		F4	Ripristino frontalini e bordi
		F5	Sistemazione marciapiedi
A	Opere provvisionali	A3	Opere provvisionali: smontaggio del ponteggio
		A4	Smobilizzo cantiere
